

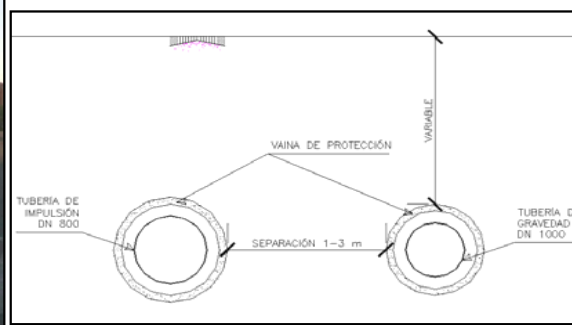
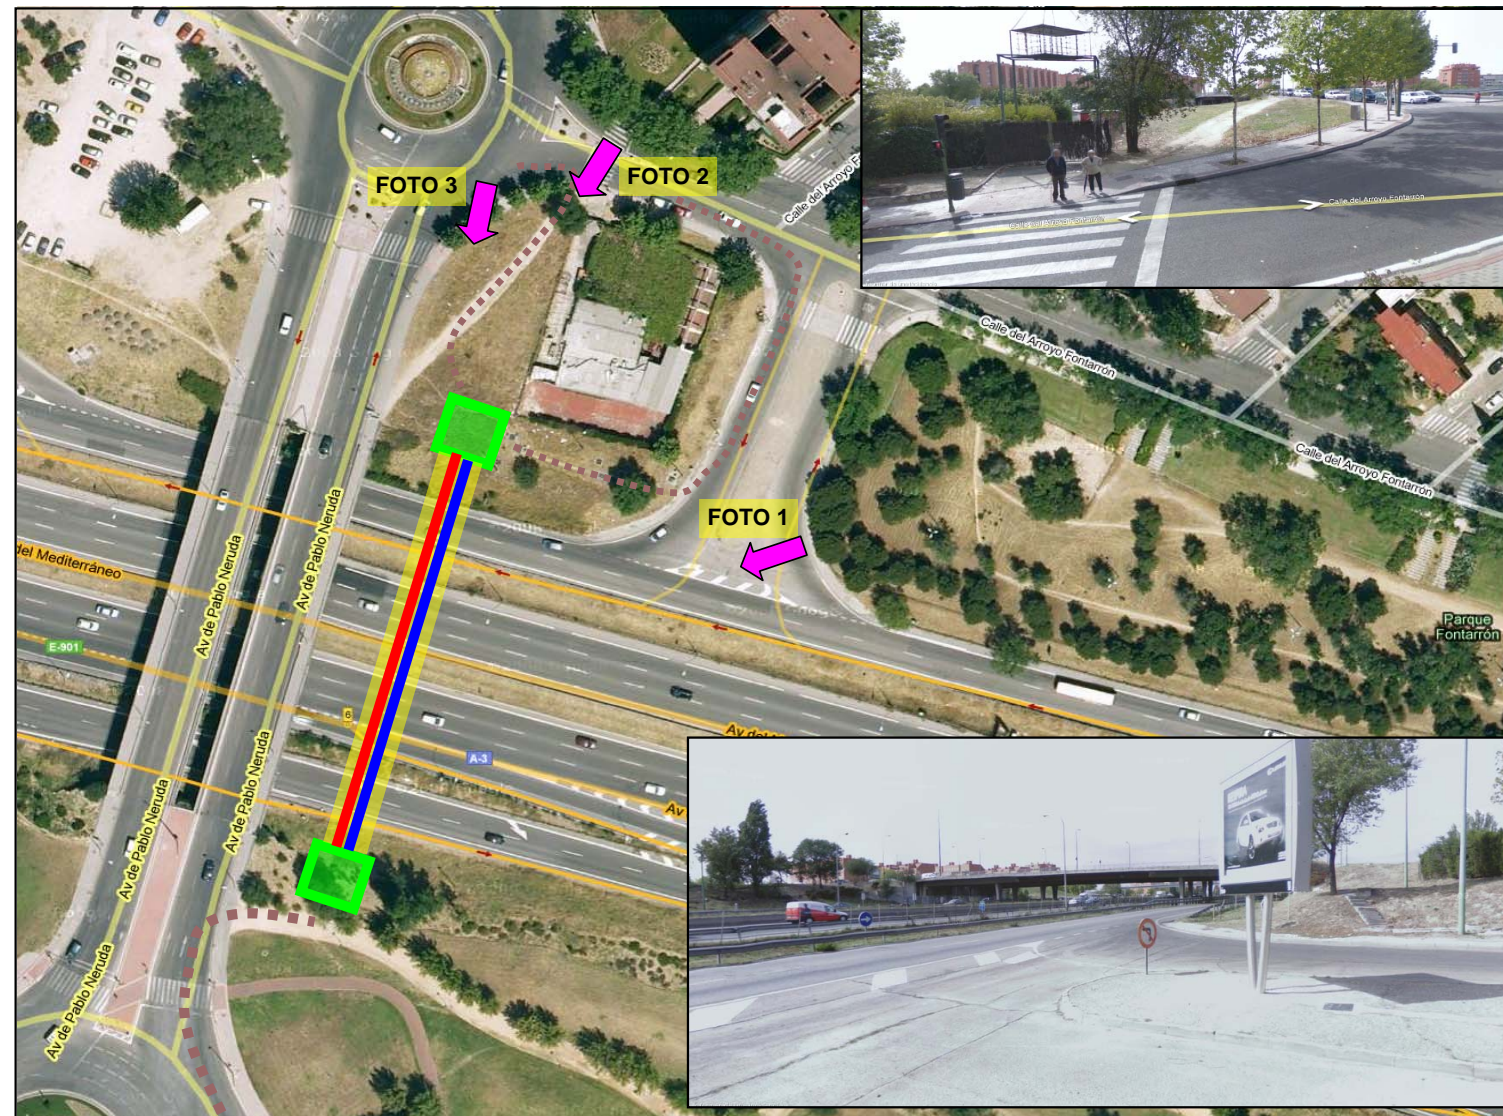


HINCA AVENIDA DEL MEDITERRÁNEO

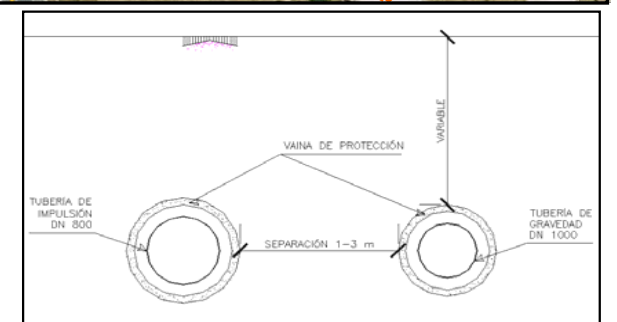

ACTIVIDADES	Días labor.	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4
Excavación	3	█			
Muro de reacción	7	█			
Instalacion maq. empuje DN 1200	2	█			
Hincado de la tubería DN 1200	18	█	█	█	
Instalacion maq. empuje DN 800	2		█		
Hincado de la tubería DN 800	18		█	█	
Desmontaje equipos de empuje	3				█

HINCA AUTOVIA M-40 (L=130m)

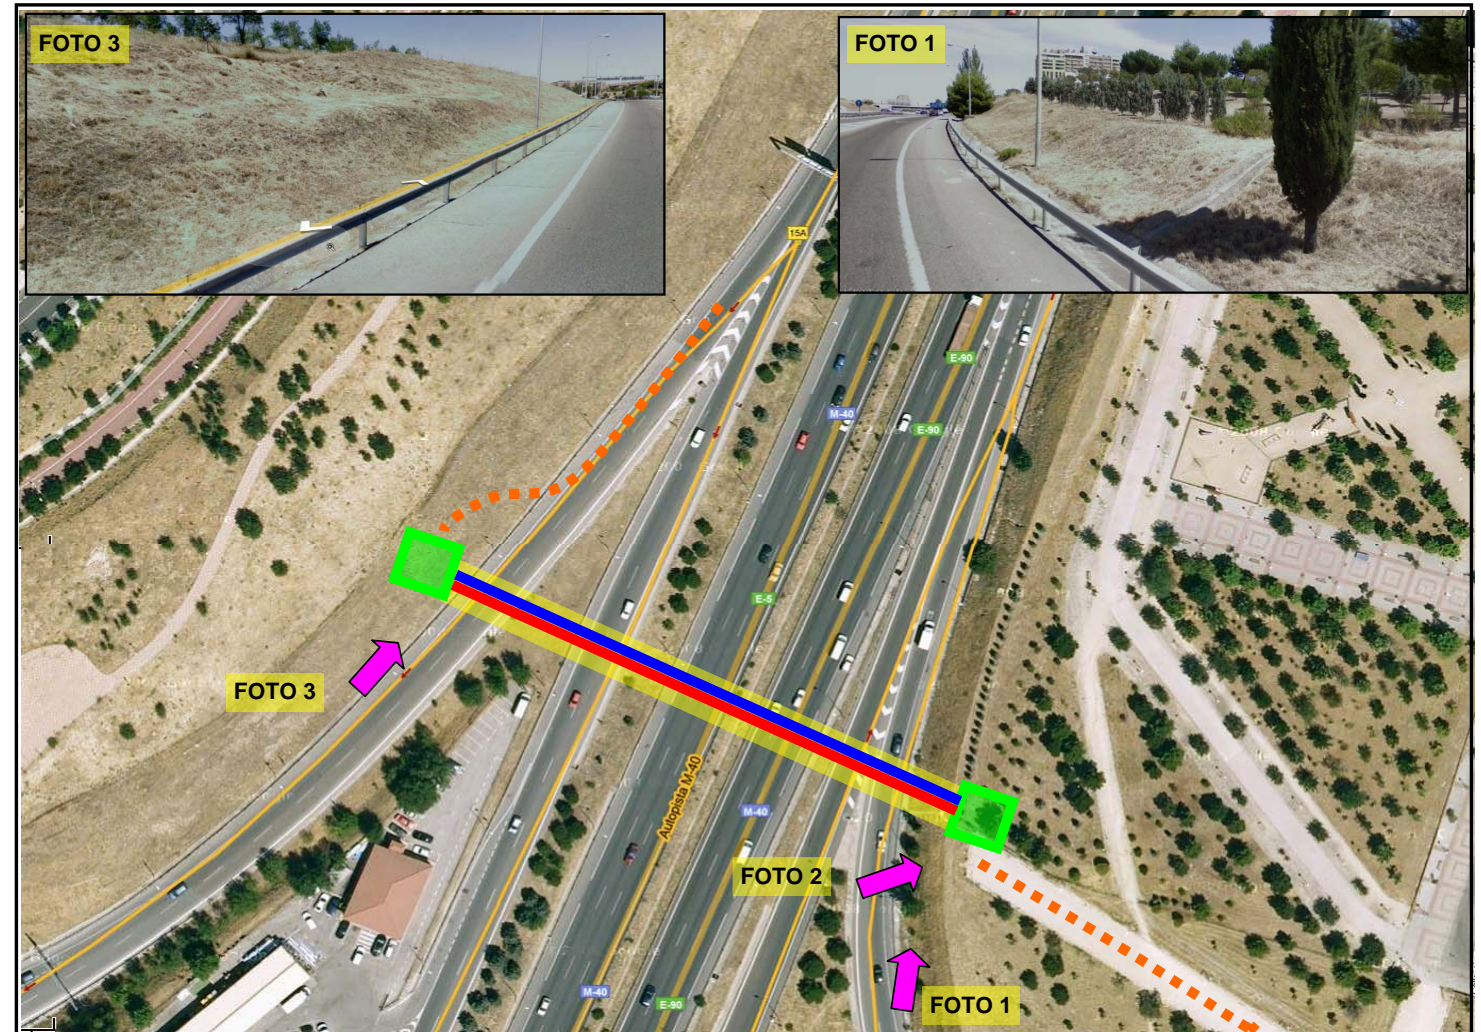

ACTIVIDADES	Días labor.	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4
Excavación	3	█			
Muro de reacción	7	█			
Instalacion maq. empuje DN 1200	2	█			
Hincado de la tubería DN 1200	26	█	█	█	
Instalacion maq. empuje DN 800	2		█		
Hincado de la tubería DN 800	26		█	█	
Desmontaje equipos de empuje	3				█
