
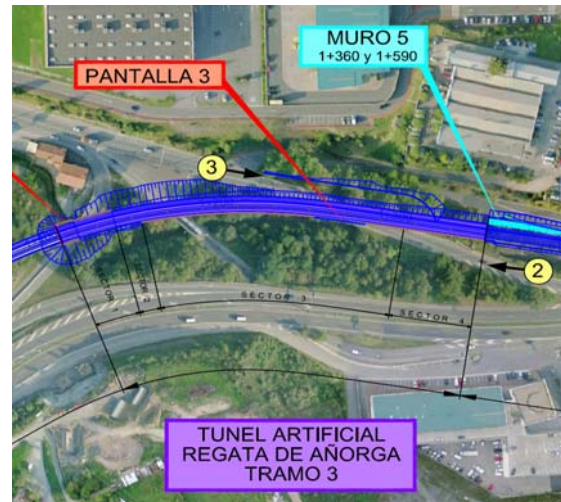


## TÚNELES ARTIFICIALES 1 Y 2

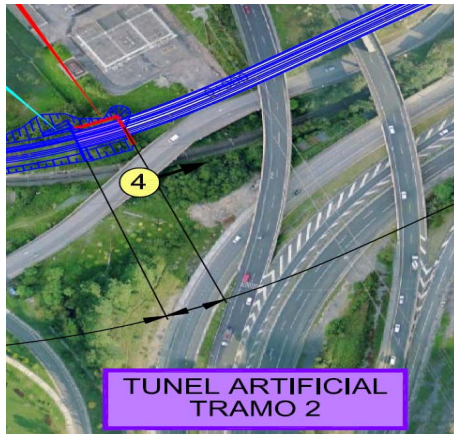

## EJECUCIÓN DE LA SECCIÓN DE HORMIGÓN

LONGITUDES				
<i>Longitud del túnel artificial</i>				
TÚNEL TIPO 1	20,00 m	(*) A efectos de programación se ha tomado la sección más restrictiva		
TÚNEL TIPO 2 (*)	200,00 m			
CIMENTACIÓN				
<i>Mediciones en m3/ml</i>	<i>Medición</i>	<i>Rendimiento</i>	<i>Tiempo</i>	<i>Turnos</i>
Saneado de la base	20,06 m3/ml	90 m3/h	0,2228889 h/ml	1
Cimentación	6 m3/ml	8 m3/h	0,75 h/ml	1
Contrabóveda	0,00 m3/ml	6 m3/h	0,00 h/ml	8 h
TIEMPO DE EJECUCIÓN	TÚNEL TIPO 1		TÚNEL TIPO 2(*)	
	19 h	2 días	150 h	19 días
EQUIPO DE HORMIGONADO EN ALZADOS				
<i>Carro de Encofrado</i>				
Longitud del carro	12 m	→ 24,00 m		
Nº de carros de encofrado	2 ud			
<i>Operaciones</i>				
	<i>Duración</i>			
Traslado, encofrado y montaje	2 días			
Hormigonado	3 días			
Desencofrado	2 días			
<b>TOTAL Operaciones en 1 movimiento del carro</b>		<b>7 días</b>		
RESUMEN	TRAMO Túnel entrada		TRAMO Túnel salida	
	1 puestas		9 puestas	
Nº de días	7 días		63 días	
TIEMPO DE EJECUCIÓN	0,40 meses		3,30 meses	
