
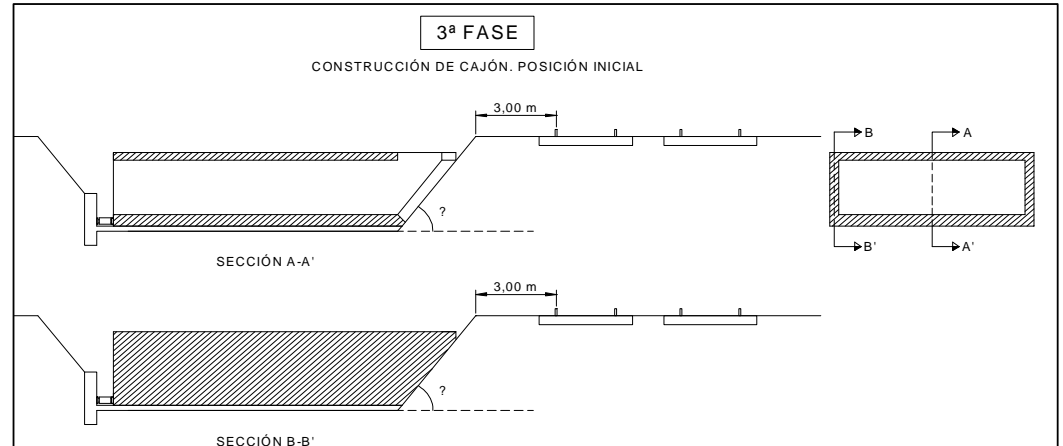
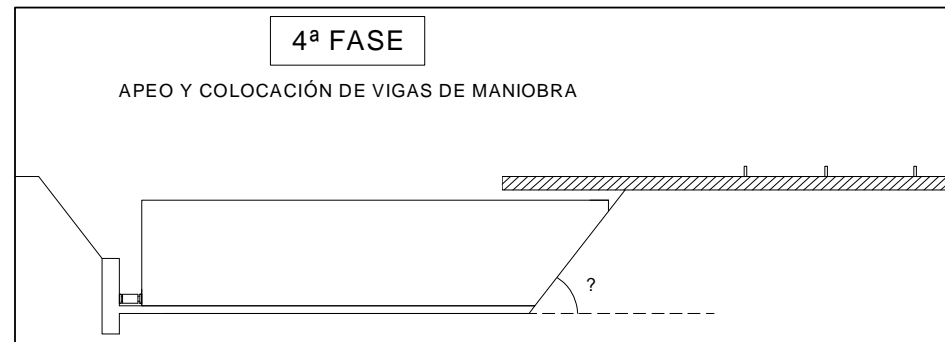
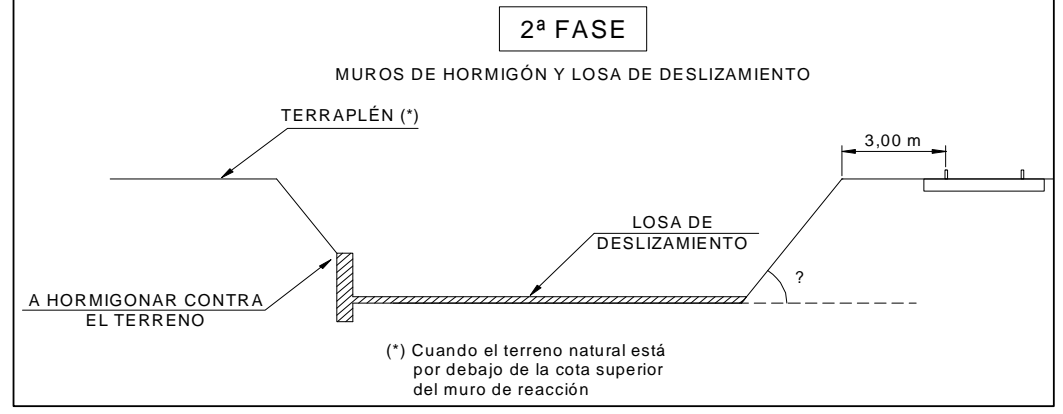
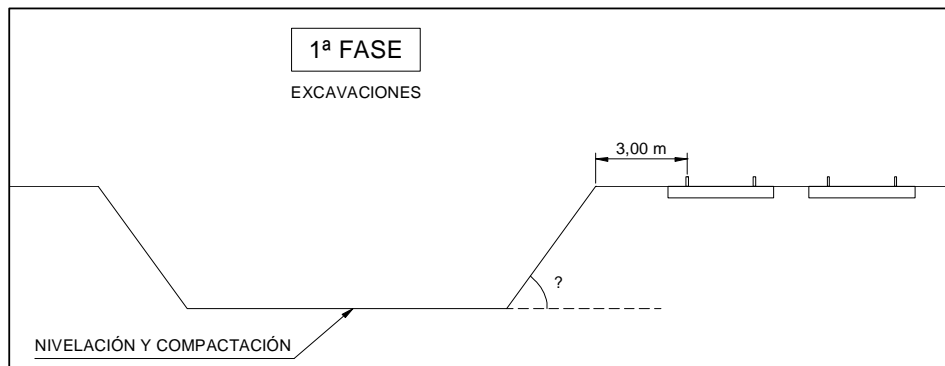
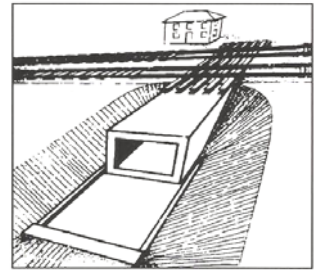
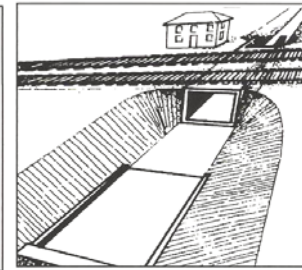


## CONSTRUCCIÓN MARCO POR PROCEDIMIENTO CAJÓN EMPUJADO

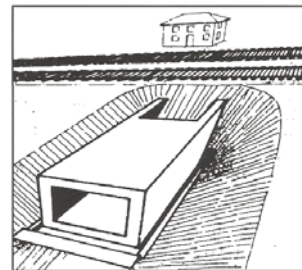

### PROGRAMACIÓN

ACTIVIDADES	Días	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5
<b>MARCO EMPUJADO</b>						
<b>Trabajos previos</b>	3					
Adecuación de la zona	3					
<b>Plataforma de empuje</b>	15					
Excavación	8					
Solera de deslizamiento	3					
Muretes guía	3					
Muro de reacción	5					
<b>Ejecución del cajón</b>	15					
Losa inferior	5					
Hastiales	5					
Losa superior	5					
Apeo y sustentación de las vías	13					
Aletas	8					
<b>Proceso de Hinca</b>	10					
Empuje oleodinámico	5					
Reposición de la banquetta de vías	5					
<b>Varios</b>	15					
Impermeabilización, drenaje	13					
Rellenos	13					
<b>Terminaciones</b>	10					
Terminación, remates	10					

28 DÍAS DE FRAGUADO DE LA ESTRUCTURA
