

PÉRGOLA

	EXC./PREP.	ENCOFRADO	FERRALLADO	HORMIGONADO	DESENCOFRADO	RENDIMIENTO
PILAS						
PILOTES	-	-	-	-	-	0,50 ud/día
ENCEPADO TIPO 1	-	-	-	-	-	-
ENCEPADO TIPO 2	-	-	-	-	-	-
ZAPATA TIPO 3	1	0,5	1	1	1	4,50 días
ZAPATA TIPO 4	-	-	-	-	-	-
FUSTES PILAS	-	1	0,5	0,5	1	3,00 días
ESTRIBOS						
ZAP. ESTRIB. TIPO A	0,5	0,5	0,5	0,5	1	3,00 días/tr
ZAP. ESTRIB. TIPO B	-	-	-	-	-	-
MURO ESTRIBO Sección A	-	5	5	3	2	15,00 días
MURO ESTRIBO Sección B	-	8	8	6	2	24,00 días
MURO ESTRIBO Sección C	-	6	6	4	2	18,00 días

	VIGAS			LOSA SUPERIOR				
	UD/DÍA	Nº VIGAS	TIEMPO E.J.C.	PRELOSAS	ENCOFRADO	FERRALLADO	HORMIGONADO	RENDIMIENTO
TABLERO								
TABLERO DE VIGAS PREFABRICADAS	2 ud/día	90	45,00 días	1,00 días	2	2	2	6,00 días/tr


	ZAPATAS					ESTRIBOS				FUSTES					
	TIPO	LONG	RENDIMIENTO O/TRAMO	EQUIPOS	TIEMPO	TIPO	RENDIMIENTO O	EQUIPOS	TIEMPO	LONGITUD MEDIA	LONGITUD MODULOS ENCOFRADO	Nº PILAS	RENDIMIENTO O	EQUIPOS	TIEMPO
ESTRIBO 1	A	212 m	3,00 días/tr	2	29 días	Sección A	15,00 días/ud	2	9 días						
						Sección B	24,00 días/ud	2	14 días						
						Sección C	18,00 días/ud	2	10 días						
ESTRIBO 2	A	212 m	3,00 días/tr	2	29 días	Sección A	15,00 días/ud	2	9 días						
						Sección B	24,00 días/ud	2	14 días						
						Sección C	18,00 días/ud	2	10 días						
PILAS ESTRIBO 1									7,50 m aprox.	12,00 m	22 ud	3,00 días/ud	2	37 días	
PILAS ESTRIBO 2									7,50 m aprox.	12,00 m	22 ud	3,00 días/ud	2	37 días	
TOTAL ZAPATAS					59 días	TOTAL ESTRIBOS				66 días	TOTAL FUSTES				74 días

DATOS DE CÁLCULO

COEFICIENTE CLIMATOLÓGICO 0,90

LONGITUD MODULOS ENCOFRADO		
PILAS	TABLERO	ZAPATAS
12 m	12 m	12 m

Nº DE EQUIPOS	PILAS	ESTRIBOS	ZAP.	FUSTES	TABLERO
	1 EQU.	2 EQU.	2 EQU.	2 EQU.	1 EQU.

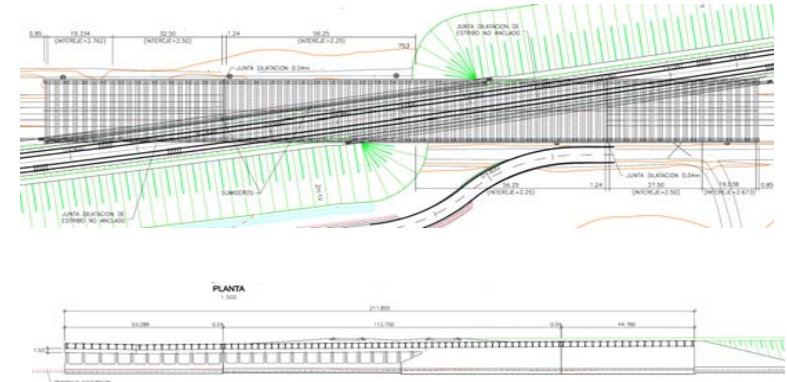

	TABLERO							
	COLOCACIÓN VIGAS	HORMIGONADO						
	LONGITUD	LONGITUD TRAMO	Nº TRAMOS	PRELOSAS	LOSA SUPERIOR	EQUIPOS	TOTAL	
TABLERO	45,00 días	212,00 m	12,00 m	18	18,00 días	108,00 días	2	95 días
TOTAL TABLERO							95 días	

