PROVILSA	TITULO DE LA OBRA:	AUTOR	FECHA	TITULO
PROMOCIÓN DE VIVIENDAS, INFRAESTRUCTURAS Y LOGÍSTICA, S.A. EMPRESA PÚBLICA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN	"NUEVO ACCESO A ZAMORA. CONEXIÓN DE LAS CARRETERAS CL-527 Y N-122		23/06/2009	ESPACIOS - TIEMPOS

GLORIETA 1 - GLORIETA 2 - GLORIETA 3 - VIAL 1 - VIAL 2 - VIAL 3 - CONEXIÓN CRTA. DE ALMARAZ

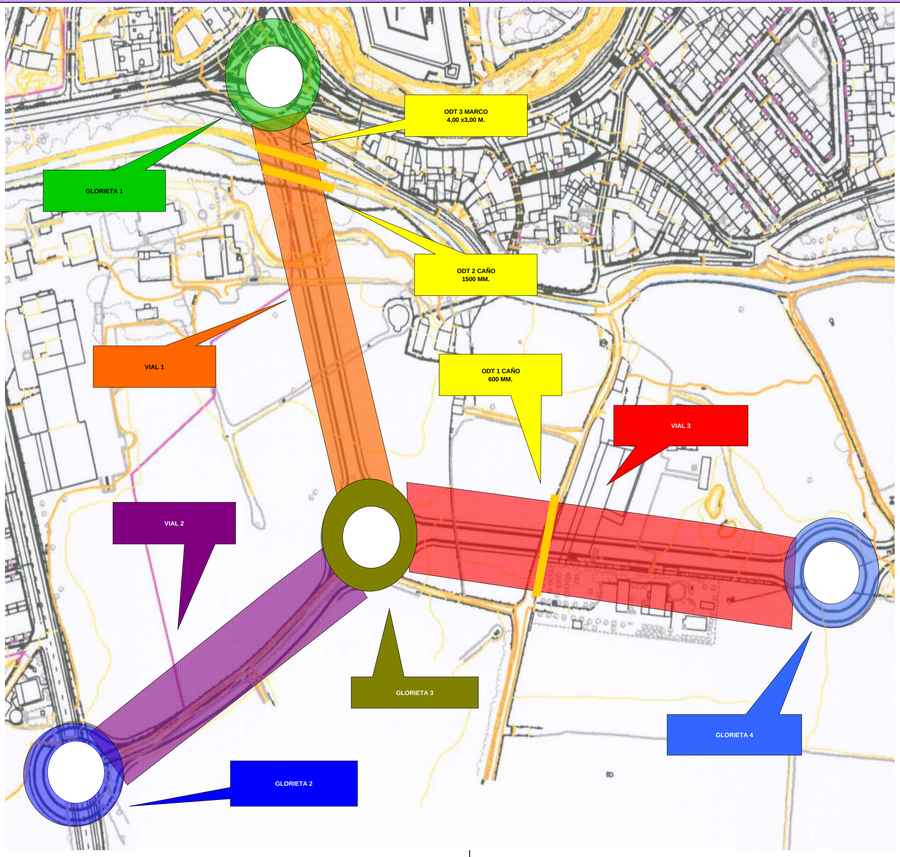

PUENTE SOBRE EL RIO DUERO - GLORIETA 5

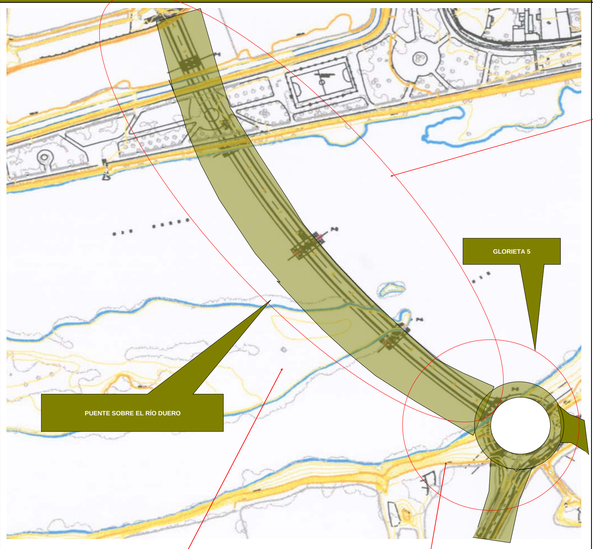





GLORIETA 6 - VIAL 4 - CONEXIONES CON CL-527 Y N-122



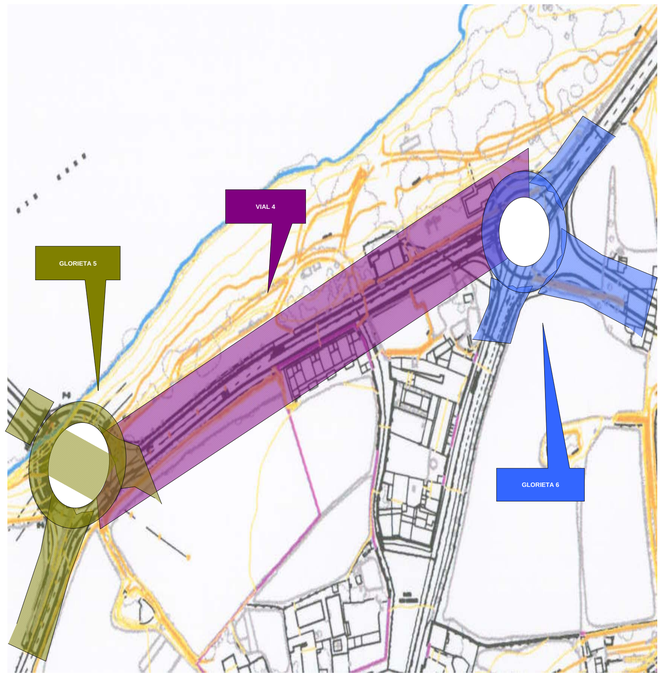





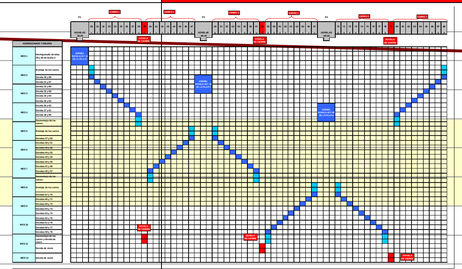

MESES		GLORIETA 2	VIAL 2	GLORIETA 3	VIAL 1	GLORIETA 1	VIAL 3	GLORIETA 4	PUENTE SOBRE EL RÍO DUERO	GLORIETA 5	VIAL 4	GLORIETA 6	MESES	
OIC	1	TERRAPLÉN DESMONTE		OBRAS ACCESORIAS Y REPOSICION DE SERVICIOS FIRME DESMONTE	INSTALACIONES PREVIAS Y REPLANTEO GENERAL	DESMONTE	OBRAS ACCESORIAS Y REPOSICION DE SERVICIOS	DESMONTE	OBRAS ACCESORIAS Y REPOSICION DE SERVICIOS		INSTALACIONES PREVIAS Y REPLANTEO GENERAL		OIC	1
ENE	2	FASE 2	OBRAS ACCESORIAS Y REPOSICION DE SERVICIOS SUELO CEMENTO FIRME TERRAPLÉN	FASE 1		FASE 1	TERRAPLÉN FIRME SUELO CEMENTO	FASE 1					ENE	2
FEB	3	TERMINACIÓN Y REMATES	SUELO CEMENTO	TERMINACIÓN Y REMATES		TERMINACIÓN Y REMATES		TERMINACIÓN Y REMATES					FEB	3
MAR	4												MAR	4
ABR	5												ABR	5
MAY	6												MAY	6
JUN	7												JUN	7
JUL	8	OBRAS ACCESORIAS Y REPOSICIÓN DE SERVICIOS	TERRAPLEN		TERRAPLEN		TERRAPLEN					DESMONTE	JUL	8
AGO	9	DESMONTE SUELO CEMENTO	FASE 1		ODT2 TUBO 1500 MM.		ODT1 TUBO 600 MM.	OBRAS ACCESORIAS Y REPOSICIÓN DE SERVICIOS				FASE 1	AGO	9
SEP	10	FIRMES	TERMINACIÓN Y REMATES		ODT3 MARCO 4,00 x 3,00 M. P.K. 0+042		TERMINACIÓN Y REMATES	SUELO CEMENTO DESMONTE				TERMINACIÓN Y REMATES FIRME	SEP	10
OCT	11							FIRMES					OCT	11
NOV	12			DESMONTE		OBRAS ACCESORIAS Y REPOSICIÓN DE SERVICIOS							NOV	12
DIC	13	OBRAS ACCESORIAS Y REPOSICIÓN DE SERVICIOS	TERRAPLEN	SUELO CEMENTO	TERMINACIÓN Y REMATES	FIRMES							DIC	13
ENE	14	SUELO CEMENTO	FASE 2	DESMONTE									ENE	14
FEB	15		TERMINACIÓN Y REMATES	FIRMES									FEB	15
MAR	16												MAR	16
ABR	17												ABR	17
MAY	18												MAY	18
JUN	19	OBRAS ACCESORIAS Y REPOSICION DE SERVICIOS											JUN	19
JUL	20	FASE 2	TERRAPLÉN SUELO CEMENTO		TERRAPLÉN	OBRAS ACCESORIAS Y REPOSICION DE SERVICIOS							JUL	20
AGO	21	FIRME DESMONTE	SEÑALIZACIÓN	OBRAS COMPLEMENTARIAS E ILUMINACIÓN	SUELO CEMENTO	FASE 2		DESMONTE	FASE 8 FASE 9	OBRAS ACCESORIAS Y REPOSICION DE SERVICIOS	DESMONTE		AGO	21
SEP	22	INTEGRACIÓN AMBIENTAL: PLANTACIONES				FIRME				FASE 2	FIRME TERRAPLÉN SUELO CEMENTO	OBRAS COMPLEMENTARIAS E ILUMINACIÓN INTEGRACIÓN AMBIENTAL: PLANTACIONES	SEP	22
OCT	23	LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRA				LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRA							OCT	23
NOV	24										SEÑALIZACIÓN		NOV	24

2010

2011

2012
